

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 276/1308.13/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1140 Bxl
Rue Jacques Beldings 24

EIGENAAR: M^r Valentinus Christen

Adres: + assistant

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 13/08/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement

Begin werken: voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

adingskabel hoofdbord: 3 X 6 mm²

Alg. schakelaar: type max 40/300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider


Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 22 Ohm; RI tot 2,2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____


BESCHRIJVING: _____

Zie schema's: Eendraad + Situatieschema



UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen opmerkingen / GEHAAT



PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/08/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: BTV LD 278
nr. + naam + handtekening

De directeur,



APPARTEMENT 1^{er}

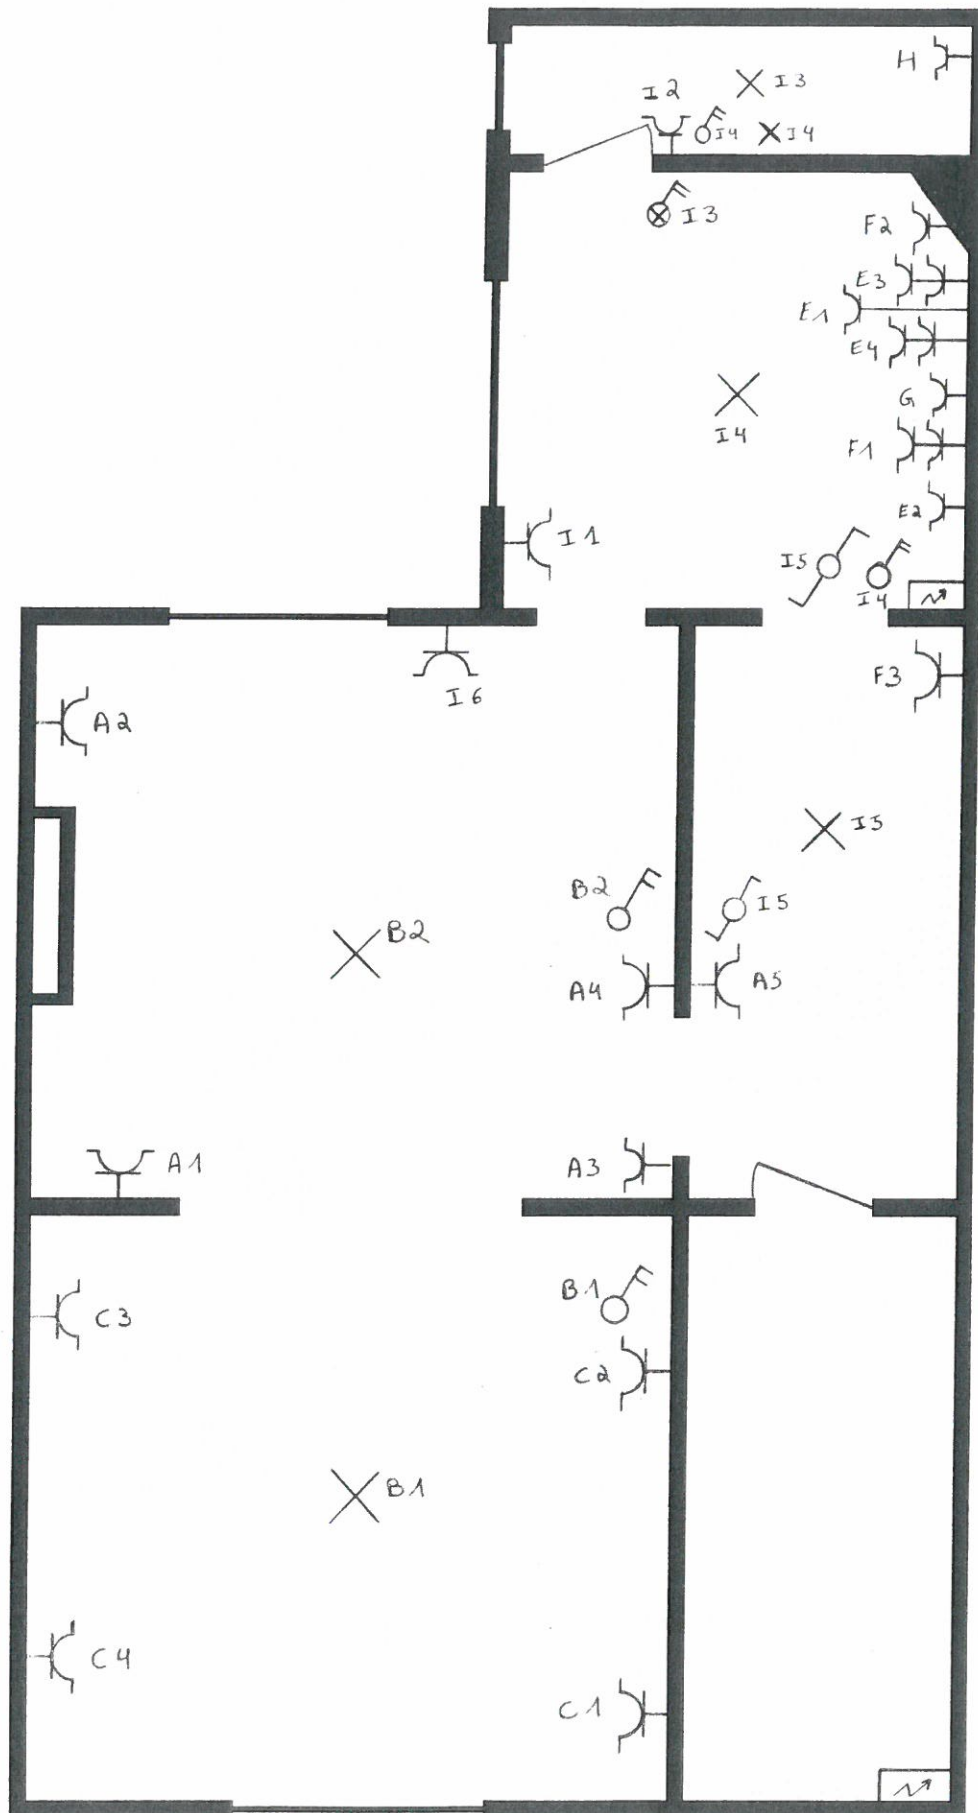

CAVE

