

N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

*Fluys*

Nr teller

N° comp :

5254489

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: *04/04 81/1/*EAN code: *per priënt*

|                          |                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                                  |                                  |                       |                       |                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aard onderzoek : AREI    | 86                               | 87/86                 | 87/88                 | 88                    | 95                    | 97                    | 270                   | 271                              | 276                   | 276bis                           | TT                               | TN                    | IT                    | Voorschr. netbeheerder<br>Prescription du<br>gest. de réseau de distr. |
| Genre de contrôle : RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                                                  |

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

*Sp. Pierre Hauwaert 25. 114.032*

Eigenaar

Propriétaire :

*Semel. Beyens*

Adresse :

Installateur :

*E. De Buyck*BTW / TVA : *0545.868.844*

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

*5/04/15*

Ik. / C.I. :

Inspecteur: *Van Rint*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

|                          |                                            |                               |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Spanning : <i>3x230V</i> | Meter / bord verbinding : <i>V. 3 4 10</i> | Max. beveiliging : <i>40A</i> |
| Tension                  | Liaison compteur-tableau :                 | Protection max. :             |

|                                     |                     |      |                                 |
|-------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------|
| Aardelektrode : <i>contingente</i>  | Isolatie : <i>∞</i> | Mohm | Aantal verdeelborden : <i>2</i> |
| Electrode de terre : <i>20,40hm</i> | Isolément :         |      | Nombre de tableaux :            |

| Differentieelschakelaars<br>Interrupteurs différentiels |           |          | Aantal eindstroombanen : <i>5</i> |                  | Test ΔIn                         |                       | 1 ΔIn                            |                       | AREI / RGIE                      |                                  |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| In (A)                                                  | Δ In (mA) | type     | Nombre des circuits terminaux :   |                  | OK                               | NOK                   | OK                               | NOK                   | 270                              | 271                              | 278                   |
| <i>40A</i>                                              | <i>30</i> | <i>A</i> | <i>generale</i>                   | <i>Gene</i>      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| <i>40A</i>                                              | <i>30</i> | <i>A</i> | <i>div. in CRAZI</i>              | <i>div</i>       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |          | <i>de 1 en 2</i>                  | <i>de 1 en 2</i> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |          |                                   |                  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |          |                                   |                  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |

|                                                               |                       |                                                   |                       |                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Visueel nazicht : algemeen : OK                               | NOK                   | directe aanraking : OK                            | NOK                   | Indirecte aanraking : OK                            | NOK                   |
| Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | contact direct : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                     |                           |                                                               |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aansluitingen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> | Potentiaalvereffeningen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> |
| Raccordements :                                     |                           | Liaisons equipotentielles :                                   |                           |

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

*neant*

VISUM :

Datum/date :

## Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.  
L'installation est — ~~niet~~ — conforme au RGIE et peut — ~~niet~~ — être mise en service — rester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard un an après la date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *5/04/2018*  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.  
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

| Niet conform          |                       | Conform                          |                       | N° vorig rapport |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 276bis AK             | 274 AK                | 276bis HK                        | 274 HK                | <i>AV</i>        |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                  |
| 271 AK                |                       | 271 HK                           |                       |                  |
| <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/>            |                       |                  |
| 276 AK                |                       | 276 HK                           |                       |                  |
| <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/>            |                       |                  |

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enquête dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: 63274/634/125

F 098651

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
☒ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

124

# PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:

Demandeur: CEVE X I M.

Responsable des travaux:

Installation:

Propriétaire/gestionnaire:

Nom, Prénom:

Nom, Prénom:

Adresse:

N° carte d'identité:

CP + Commune:

N° TVA: BE

Tél:

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐

|                                             |                                        |                                                                                |                                    |                                            |                                     |                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Art 270            | <input type="checkbox"/> mise en usage | <input type="checkbox"/> modification                                          | <input type="checkbox"/> extension | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 271bis | <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation |
| <input type="checkbox"/> Art 271            | <input type="checkbox"/> mobile        | <input type="checkbox"/> temporaire                                            |                                    | <input type="checkbox"/> Art 87            | <input type="checkbox"/> Art 278    | <input type="checkbox"/> Unité de travail domestique   |
| <input type="checkbox"/> Art 276            | <input type="checkbox"/> périodique    | <input type="checkbox"/> contrôle                                              |                                    | <input type="checkbox"/> Art 88            | <input type="checkbox"/> Art        | <input type="checkbox"/> Parties communes              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 276 | <input type="checkbox"/> renforcement  | <input checked="" type="checkbox"/> Art 276bis: vente d'une unité d'habitation |                                    | <input type="checkbox"/> Art               | <input type="checkbox"/> Art        | <input type="checkbox"/> Unité de travail              |

Données générales de l'installation électrique:

|                          |                                                       |                                                                                               |                                 |               |                                                        |                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Données distributeur     | EAN                                                   | Compt. kWh n°: 5256729                                                                        | Index jour: 0011256             | Index nuit: — | <input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué | <input type="checkbox"/> Compt.kWh non placé |
|                          | Protection branchement (A): 20 25 32 40 50 63 80 100  | Compt. kWh exclusif nuit: n°: Index nuit:                                                     |                                 |               |                                                        |                                              |
| Données installation     | Conçue pour U <sub>n</sub> : 230V 3x230V 3N400V       | Type de prise de terre:                                                                       |                                 |               |                                                        |                                              |
|                          | Courant nominal maximum (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 | <input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets |                                 |               |                                                        |                                              |
| Description installation | Câble d'alimentation tableau principal: 3 X 70 mm²    | Type: VOB                                                                                     |                                 |               |                                                        |                                              |
|                          | Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA                  | Nombre de tableaux: 2                                                                         | Nombre de circuits terminaux: 4 |               |                                                        |                                              |
| Voir annexe(s)           | Appt. 4 étages                                        |                                                                                               |                                 |               |                                                        |                                              |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |                                    |                                              |                                                |                                  |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacts Dir.                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contacts Indir. | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Appareils | <input checked="" type="checkbox"/> Matériel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/section | <input type="checkbox"/> Schémas | <input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre: 12 Ω                                                                                                                                 |                                                     |                                             |                                    |                                              |                                                |                                  |                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isolation général: 300 MΩ                                                                                                                                                           |                                                     |                                             |                                    |                                              |                                                |                                  |                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre                                                                                                                                                                 |                                                     |                                             |                                    |                                              |                                                |                                  |                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Test dispositif diff.                                                                                                                                                               |                                                     |                                             |                                    |                                              |                                                |                                  |                                                 |
| Le dispositif différentiel général: <input type="checkbox"/> était plombé <input type="checkbox"/> a été plombé <input checked="" type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé |                                                     |                                             |                                    |                                              |                                                |                                  |                                                 |

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

|                        |                                      |                         |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Infractions            | 150 1; 150 2; 16 10.                 | Visa GRD:               |
| Nouvelle installation  | PLAN schéma et repère                |                         |
| ○ Néant                | 109 1; 1904 (prise cheminée)         | Mandataire GRD:<br>Nom: |
| Infractions            | 211 et 212 plusieurs points par Mire |                         |
| Installation existante |                                      | Visa:                   |
| ○ Néant                |                                      |                         |
| Remarques              | Jour de l'acte + 18 mois             |                         |
| ○ Néant                |                                      |                         |

Conclusion(s):

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être  
recontrôlée avant le 31 / 12 / 2010  
● par le même organisme de contrôle (\*\*)

(\*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom:

Agent n°:

Date:

Pour le Directeur Général: Signature


Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☒

☐ Schéma(s) unifilaire(s): ☐

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(\*\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

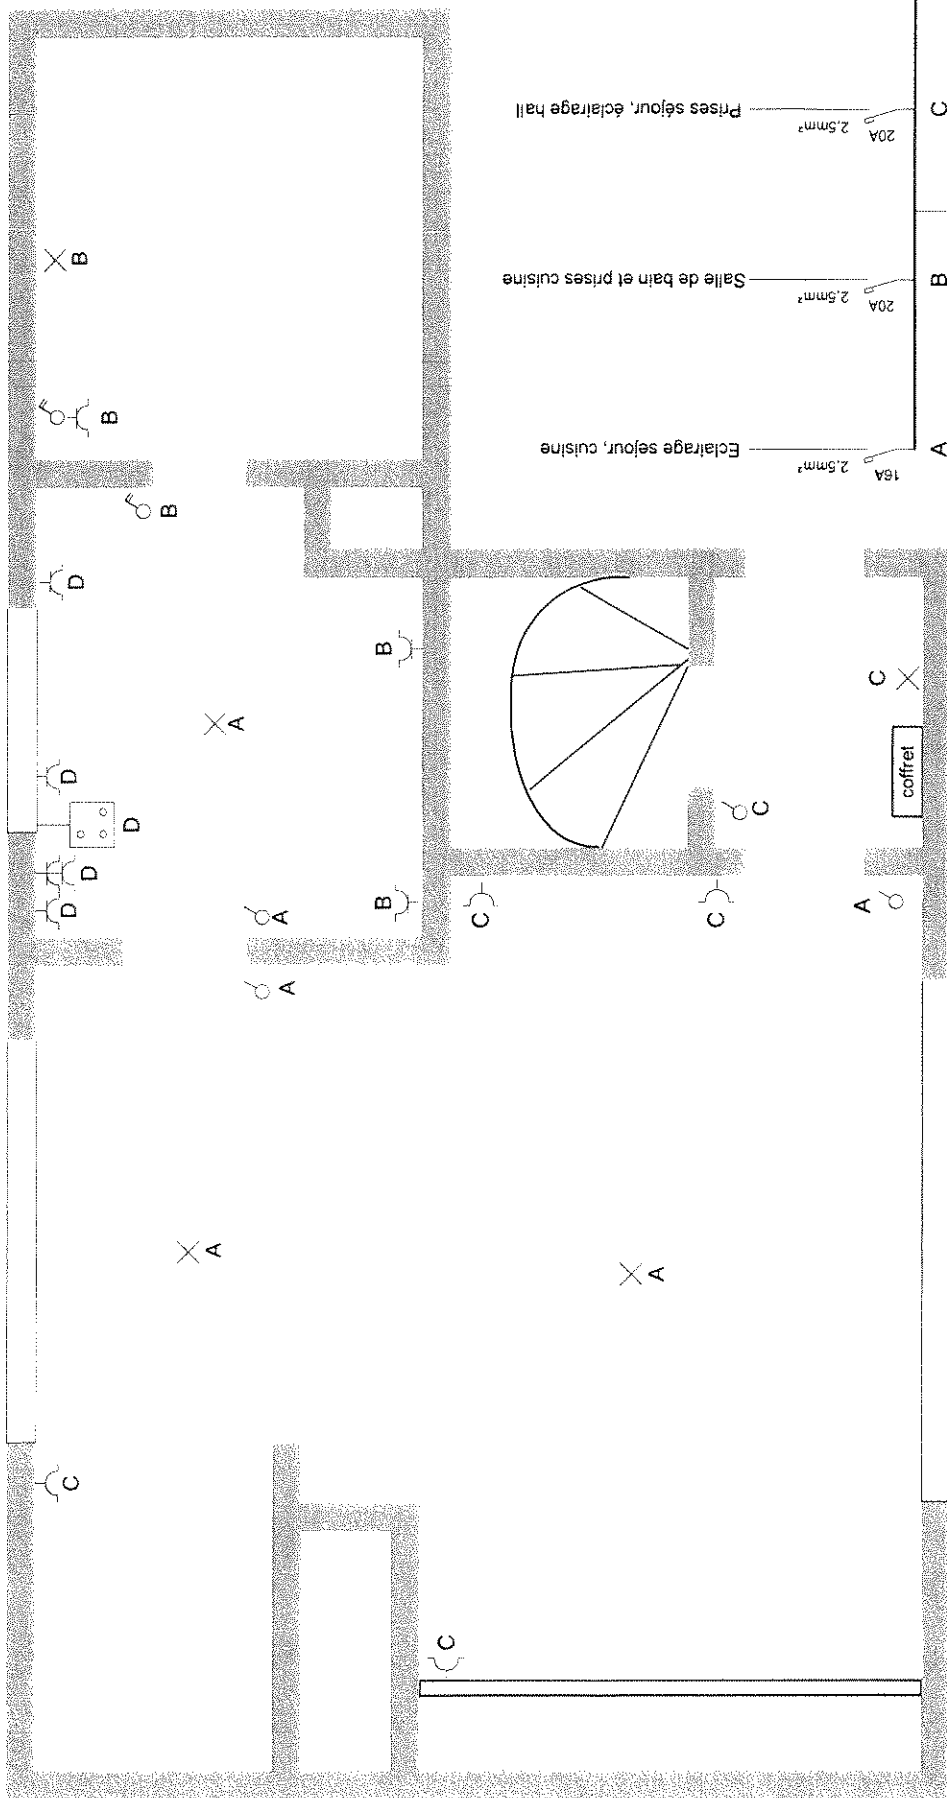

10 mm²

Δ 300

Kwh

**ELECTROTEST** v.z.w.

E. VAN LINT

date: Avril 2013

Plan et schémas  
4eme Etage

Mr et Mme Semet-Bergen  
Square Hauwaert, 25  
1140 Evere

Electricité A De Puydt  
Rue M. Van de Wiele, 12  
1030 Schaerbeek  
TEL-FAX : 02 215 32 14  
GSM : 0476 22 96 58  
E-Mail : alphonse.depuydt@skynet.be  
TVA : 545 678 847

E-Mail : alphonse.depuydt@skynet.be

TVA : 545 678 847
