

PROCES VERBAL DE VISITE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Date: 07/09/1995 Réf.: 1865

Propriétaire: Monsieur Hahmut TEPEYURT

Adresse installation: Rue Ed. Tollenaere 5 1^{er} étage

Tél.: C.p.: 1020 Localité: Bruxelles

Installateur: propriétaire

1. Société distributrice: Electabel

2. Nature installation: définitive - modification - provisoire - résidentielle - industrielle

3. Alimentation: aérienne - sous-terrain Tension: 2 x 220 V

4. Section câble compteur-tableau: 10 mm²

5. Interrupteur général: 40 A Protection générale: 15 A

[illegible]

6. Nombre de points lumineux: 2 Prises 2P: 5 Prises 3P: 1

7. Isolement général: 50 M Ohm Résistance de terre: 14 Ohm

8. Equipotentielle: ~~pas~~ en ordre; Schéma unifilaire: ~~pas~~ en ordre; Schéma d'implantation: ~~pas~~ en ordre

9. Différentiels: général: 40 A 300 mA; Autres: _____ A _____ mA
salle de bains: 40 A 30 mA

10. Compteur n°: 1 Accord pour: 32 A

11. Remarques: néant

12. **CONCLUSION:** L'installation satisfait aux prescriptions du RGIE, du Règlement Technique et aux prescriptions particulières des sociétés distributrices moyennant observation des remarques éventuelles.

L'installation ~~est~~ **peut** ~~être~~ être mise en service.

Agent visiteur: *Ir. B. Manche*

Pour le directeur,
l'expert agréé

Permitt

PROCES VERBAL DE VISITE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Date: 07 / 09 / 1995 Réf.: 1866
Propriétaire: Monsieur Mahmut TEPEYURT
Adresse installation: Rue Ed. Tollenaere 5 2^e étage
Tél.: C.p.: 1020 Localité: Bruxelles
Installateur: propriétaire
1. Société distributrice: Electabel
2. Nature installation: définitive - modification - provisoire - résidentielle - industrielle
3. Alimentation: aérienne - sous-terreine Tension: 2 x 230V
4. Section câble compteur-tableau: 10 mm²
5. Interrupteur général: 40 A Protection générale: 25 A

Nombre circuits	Section mm²	Protection (A)	Circuits
2	2,5	16	mixte

6. Nombre de points lumineux: 2 Prises 2P: 6 Prises 3P: 1
7. Isolement général: 50 M Ohm Résistance de terre: 14 Ohm
8. Equipotentialités: pas en ordre; Schéma unifilaire: pas en ordre; Schéma d'implantation: pas en ordre
9. Différentiels: général: 40 A 300 mA; Autres: A mA
 salle de bains: 40 A 30 mA;
10. Compteur n°: Accord pour: 32 A
11. Remarques: néant

12. CONCLUSION: L'installation satisfait aux prescriptions du RGIE, du Règlement Technique et aux prescriptions particulières des sociétés distributrices moyennant observation des remarques éventuelles.


L'installation peut être mise en service.

Agent visiteur: It. B. Manche

Pour le directeur,
l'expert agréé



1 = ÉTAGE

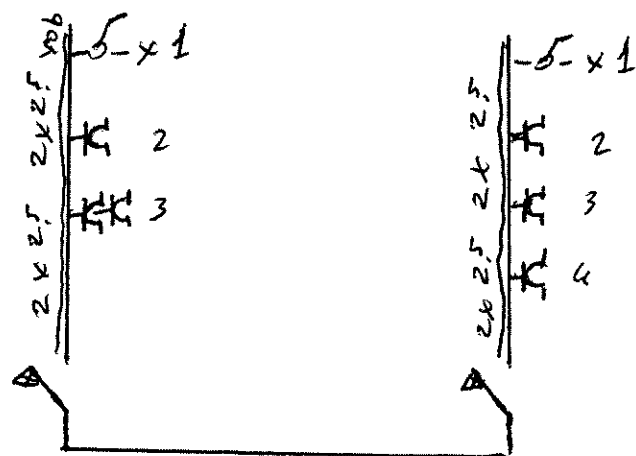

Déstallation

Mahmut Tepegurt

Rue. Ed. Tollenaere

N° 5. 1020 BXL

Mahmut

Propriétaire

Mahmut TEPEYURT

Rue. Ed. Tollenaere

N° 5. 1020 BXL

Mahmut

Responsable de l'exécution

du Travail --

Mahmut Tepegurt

Rue. Ed. Tollenaere

N° 5 BXL. 1020

Mahmut

4x40 Amp -
0,03 Amp -

A B

3x6 vvb 3x6 vvb

2x25 Amp.

4x40 Amp.
0,3 Amp.


[KW]

TECHNI-TEST
ERKEND ORGANISME AGREE
IR. B. MANCHE 02 2513474
CH. BXL. ST. 90 VILVOORDE

Mahmut

1-ETAGE


наименование

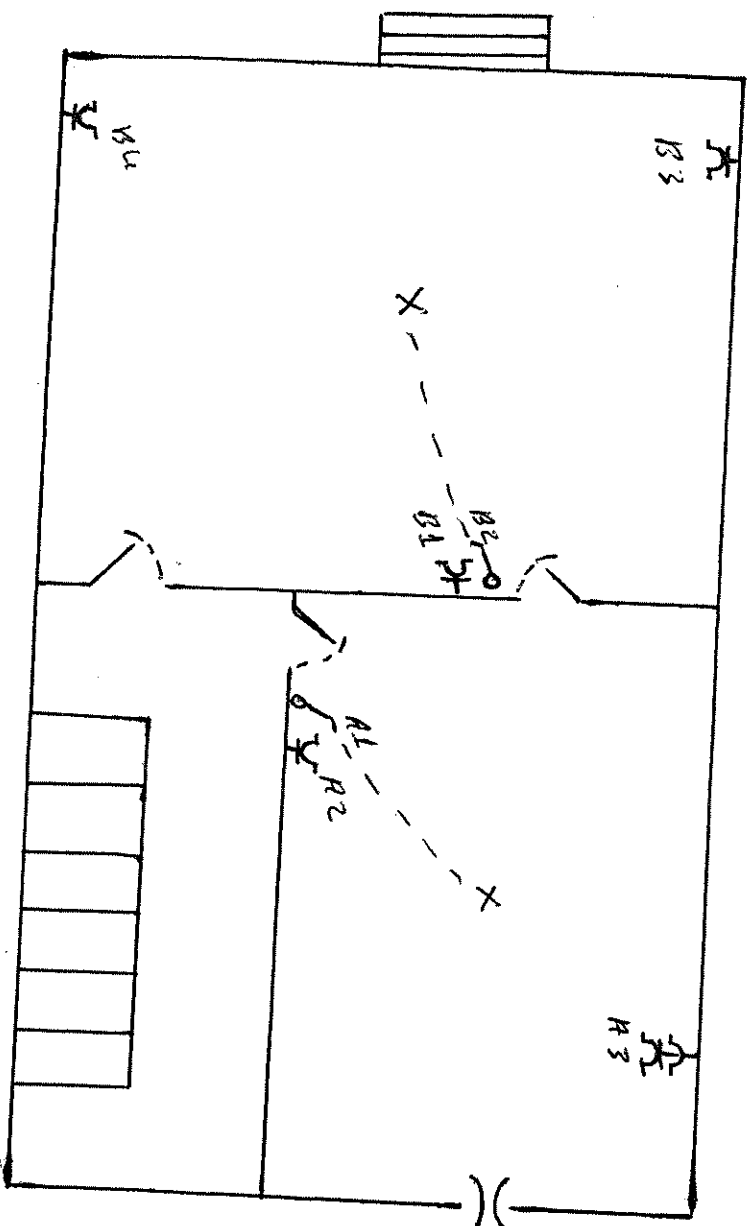

TECHNICAL TEST
ERKEND ORGANISME AGREE
IR.B.MANCHE 02 2513474
CH.BXL.ST.90 VILVOORDE



2: ÉTAGE

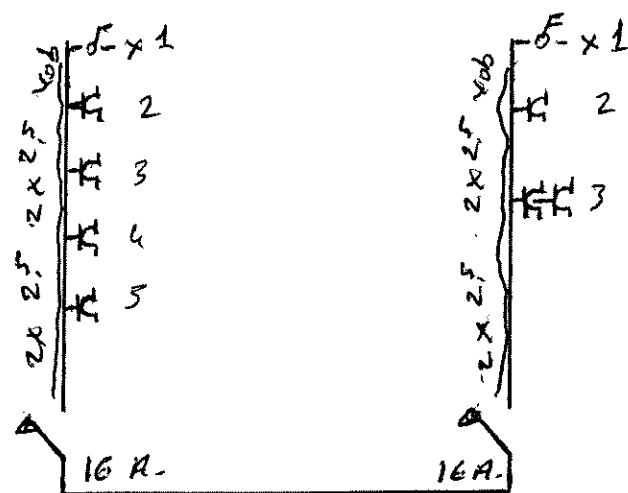

Installation

Mahmut Tepegut

Rue. Ed. Tollenaere

N° 5.1020 BXL

Maint

Propriétaire

Mahmut Tepegut

Rue. Ed. Tollenaere

N° 5.1020 BXL

Maint

Responsable de Réception


du Travail - -

Mahmut Tepegut

Rue Ed. Tollenaere

N° 5 1020 BXL

Maint

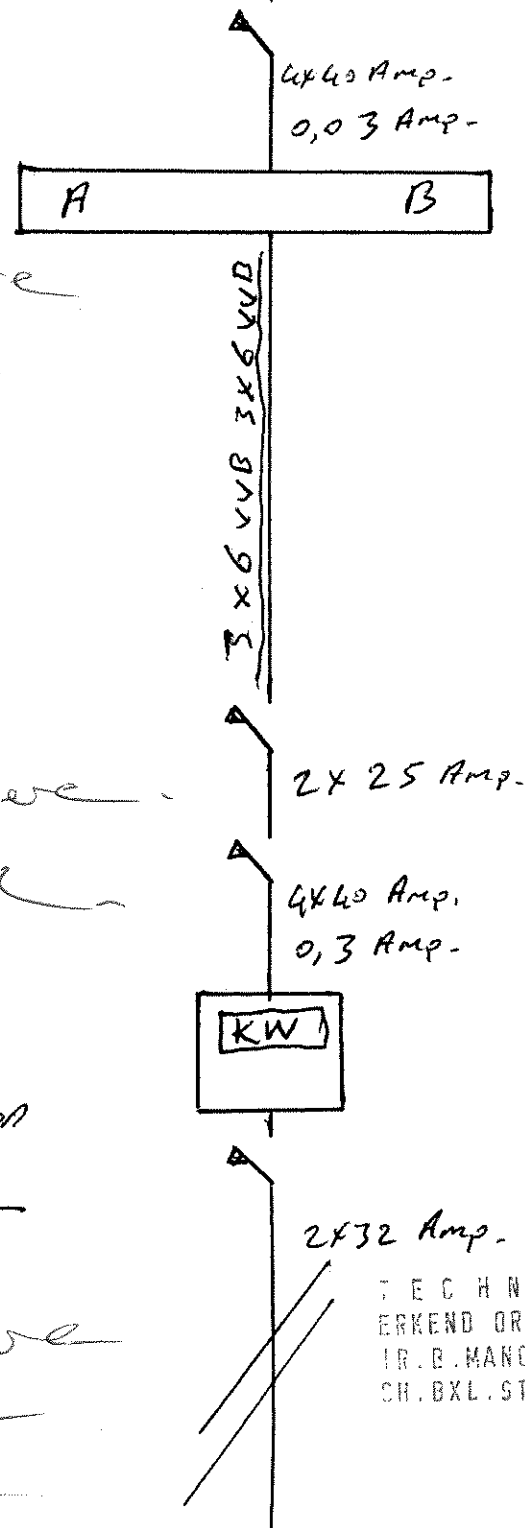


TECHNI-TEST
ERKEND ORGANISME AGREE
I.R.B. MANCHE 02 2513474
CH. BXL. ST. 93 VILVOORDE

Maint


2-ÉTAGE

projet Tepeyart

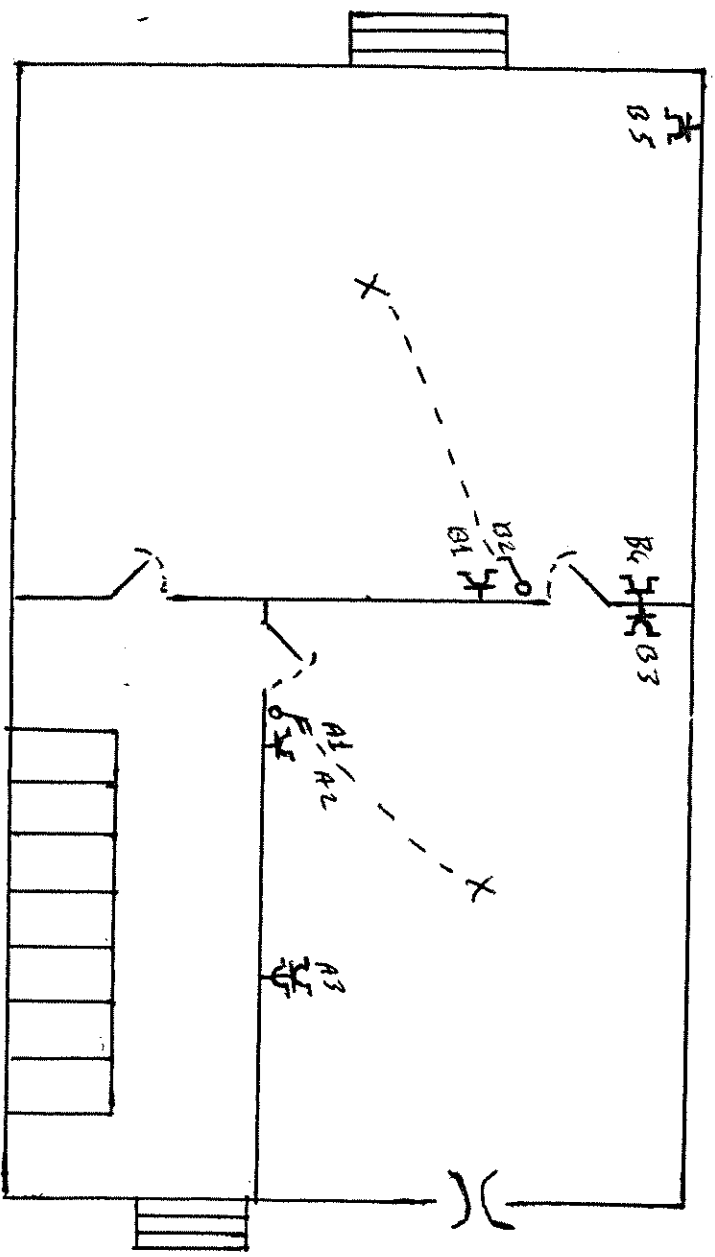


TECHNI-TEST
 ERKEND ORGANISME AGREE
 I.R.B. MANCHE 02 2513474
 CH.BXL.ST.90 VILVOORDE

3-ÉTAGÉ

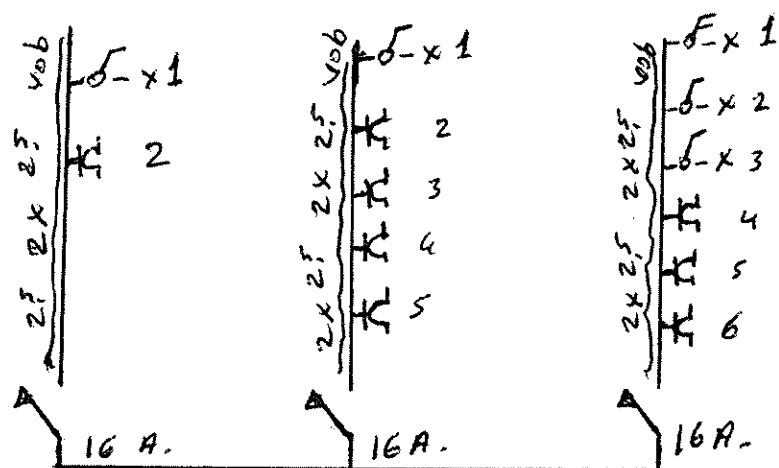

40 Amp.
0,03 Amp.



3x6 VVB 3x6

2x25 Amp.

4x40 Amp.
0,3 Amp.



2x32 A.

Installation

mahmut Tepeyurt

Rue. Ed. Tollanere

N° 5 - 1020 BXL -

Mus

Propriétaire

mahmut Tepeyurt

Rue. Ed. Tollanere

N° 5 - 1020 BXL

Mus

Responsable de l'exécution

du Travail - - -

mahmut Tepeyurt

Rue Ed-Tollanere

N° 5 - 1020 BXL


Mus

TECHNI - TEST
ERKEND ORGANISME AGREE
IR.B.MANCHE 02 2513474
CH.BXL.ST.90 VILVORDE

Mus

3. ÉTAGE

Mahmet Tepeyurt

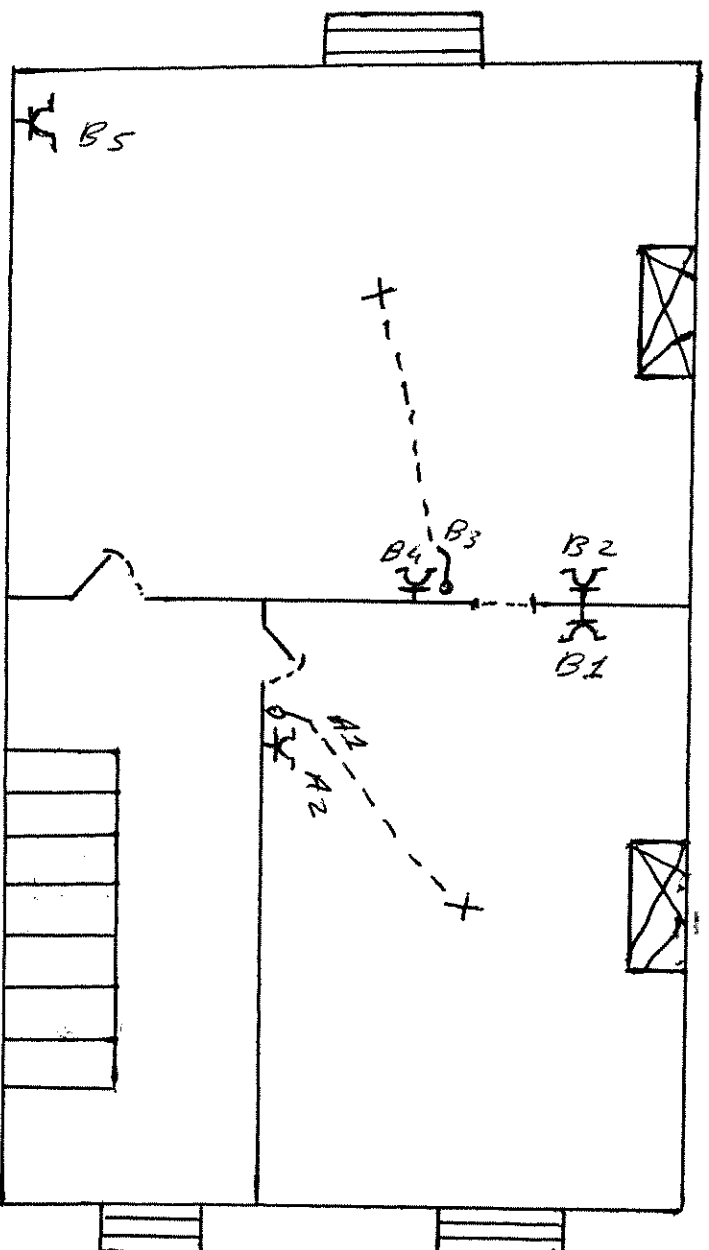


TECHNI-TEST
ERKEND ORGANISME AGREE
I.R.B. MANCHE 02 2513474
CH. BXL. ST. 90 VILVOORDE

[Signature]

Grenier

projet Tepeyunt

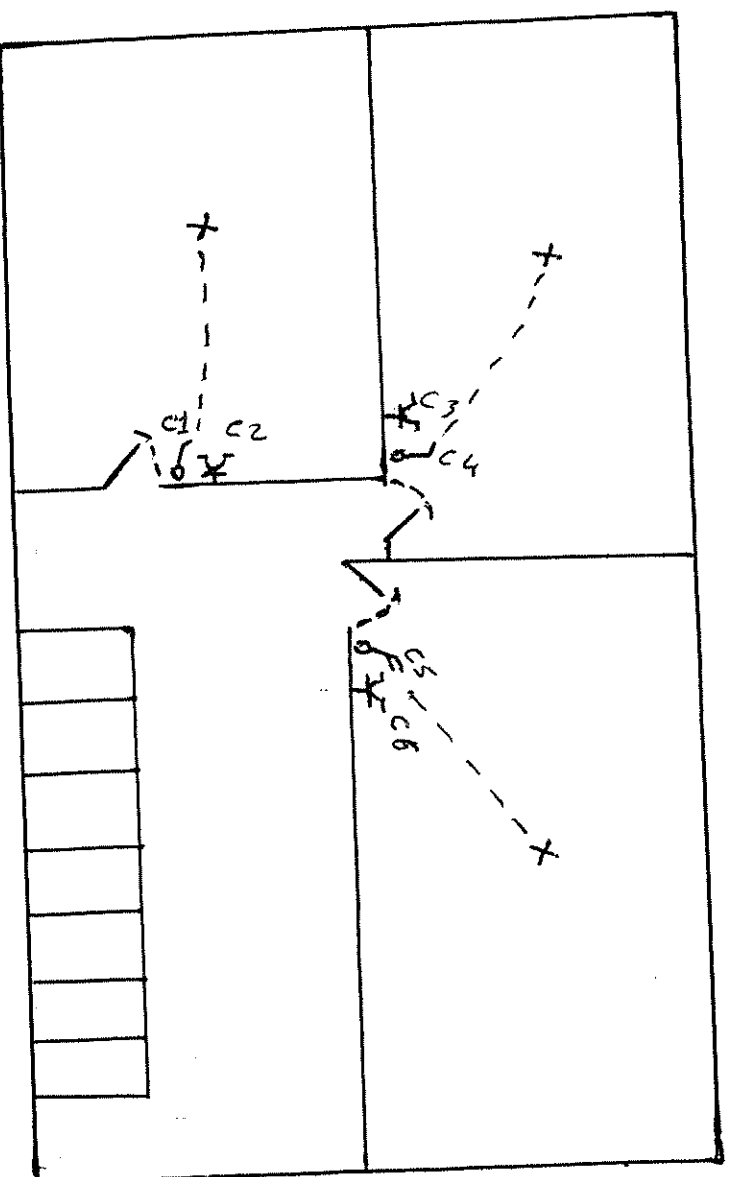

TECHNI-TEST
ERREND ORGANISME AGREE
I.R.B. MANCHE 02 25134774
CH. DXL. ST. 99 VILVORDE

[Signature]
